
وضعیت چک لیست قراردادهای پیمانکاران اجرایی

تاریخ گزارش:

پیمانکاران											
موضوع قرارداد:											
شروع قرارداد:	۵۴/۱۲	۵۴/۱۶	-	۵۵/۱۲	۵۸/۲۷	۵۸/۲۷	۵۸/۲۷	۸/۲۳	۸/۲۳	۵۹/۰۱	۵۹/۱۶
پایان قرارداد:	۵۸/۱۱	۵۸/۱۵	-	۵۹/۱۱	۶۱/۱۱/۲۷	۶۱/۱۱/۲۷	۶۱/۱۱/۲۷	۱۱/۰۷	۱۱/۰۷	۵۲/۰۴	۱۱/۱۹
تمدید اول قرارداد:	۶۱/۱۱	۶۱/۱۵	-	الحاقیه حجمی	۶۱/۱۲/۲۹	۶۱/۱۲/۲۹	۶۱/۱۲/۲۹	۱۱/۱۵	۱۱/۱۵		۱۲/۲۵
تمدید دوم قرارداد:	۱۲/۲۸	۱۲/۲۹						درخواست تمدید	درخواست تمدید		
تمدید سوم قرارداد:											
روز مانده تا پایان قرارداد:	۴۲	۴۱						۸۸	۵۷	۱۰	۵۰
درصد برنامه ای:	۱۰۰.۰%	۱۰۰.۰%						۱۰۰.۰%	۱۰۰.۰%	۱۰۰.۰%	۱۰۰.۰%
درصد واقعی:	۴۲.۸%	۳۵.۱%						۶۸.۹%	۹۵.۵%	۹۵%	۹۸.۶%
۱	برگزاری مناقصه	✓	✓	عدم نیاز	✓	ترک تشریفات	ترک تشریفات	✓	✓	✓	✓
۲	ارسال اسناد مناقصه به شرکت های مجاز	✓	✓	عدم نیاز	✓	ترک تشریفات	ترک تشریفات	✓	✓	✓	✓
۳	دریافت پاکات مناقصه	✓	✓	عدم نیاز	✓	ترک تشریفات	ترک تشریفات	✓	✓	✓	✓
۴	بازگشایی پاکات مناقصه	✓	✓	عدم نیاز	✓	ترک تشریفات	ترک تشریفات	✓	✓	✓	✓
۵	اعلام برنده مناقصه	✓	✓	عدم نیاز	✓	ترک تشریفات	ترک تشریفات	✓	✓	✓	✓
۶	دعوت از برنده مناقصه	✓	✓	عدم نیاز	✓	ترک تشریفات	ترک تشریفات	✓	✓	✓	✓
۷	تهیه قرارداد	✓	✓	عدم نیاز	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۸	ارائه نامه معرفی به بانک جهت دریافت ضمانتنامه	✓	✓	عدم نیاز	عدم نیاز	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۹	ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به واحد مالی کارفرما	✓	✓	عدم نیاز	عدم نیاز	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۰	ابلاغ قرارداد	✓	✓	عدم نیاز	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۱	ابلاغ نقشه ها	✓	✓	✓	عدم نیاز	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۲	عودت ضمانتنامه مناقصه	✓	✓	عدم نیاز	عدم نیاز	✓	عدم نیاز	✓	✓	✓	✓
۱۳	معرفی رئیس کارگاه پیمانکار با نمونه امضاء مجاز	✓	✓	عدم نیاز	عدم نیاز	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۴	تحویل زمین و پنج مارک (صور تجلسه)	✓	✓	عدم نیاز	عدم نیاز	✓	عدم نیاز	✓	✓	✓	✓
۱۵	جلسه هماهنگی شروع پروژه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۶	اخذ مجوز ورود پرسنل پیمانکار	✓	✓	عدم نیاز	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۷	اخذ مجوز ورود و خروج ماشین آلات	✓	✓	عدم نیاز	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۸	ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی	✓	✓	عدم نیاز	عدم نیاز	عدم نیاز	عدم نیاز	✓	✓	✓	✓
۱۹	ابلاغ برنامه و فرمت گزارشات	✓	✓	عدم نیاز	عدم نیاز	عدم نیاز	عدم نیاز	✓	✓	✓	✓
۲۰	درخواست پیش پرداخت	✓	✓	✓	عدم نیاز	عدم نیاز	عدم نیاز	عدم نیاز	عدم نیاز	✓	عدم نیاز
۲۱	کنترل ضمانتنامه پیش پرداخت	✓	عدم معرفی به بانک	✓	عدم نیاز	عدم نیاز	عدم نیاز	عدم نیاز	عدم نیاز	✓	عدم نیاز
۲۲	ارائه بیمه مسئولیت مدنی	۰۵/۲۹	انجام مکاتبه جهت تمدید	عدم نیاز	اتمام فعالیت	عدم نیاز	۰۲/۱۴	۰۲/۱۴	۰۲/۲۲	۰۲/۲۲	انجام مکاتبه جهت اخذ
۲۳	معرفی حساب بانکی بصورت مکتوب	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۲۴	صور تجلسه تجهیز کارگاه	تجهیز انجام شده (فاقد صور تجلسه)	تجهیز انجام شده (فاقد صور تجلسه)	عدم نیاز	عدم نیاز	عدم نیاز	عدم نیاز	عدم نیاز	عدم نیاز	✓	مکاتبات انجام شده

[illegible]


گراف لایه های جاده ییرامونی نیروگاه کارون

[illegible]

جدول پیشرفت پروژه

عملیات	درصد پیشرفت
تجزیه و تحلیل	۱۲٪
طراحی	۸۰٪
تأمین مصالح	۲۰٪
در صورت تایید ۱۰۰٪ سایر موارد تایید شده است	۱۰۰٪

وضعیت دریافتی از کارفرما (میلیارد تومان)

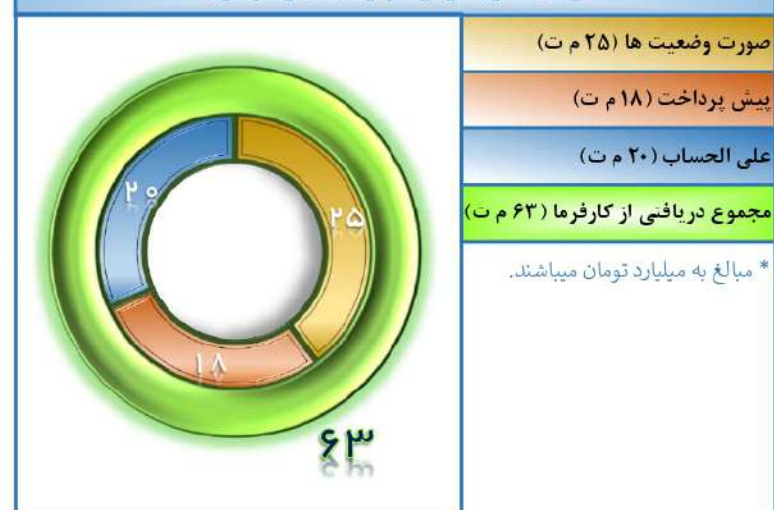

اختلاف کارکرد با صورت وضعیت

عملیات	پیمانکار	مشاور
جاء	۳۲,۳۷۱,۳۵۱	۷۳,۷۱۵,۸۳۵
	۰۹,۱۹۰,۰۲۳	۲,۲۹۲,۲۸۰
	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۴۵,۸۴۵
مجموع:	۱۱ / ۳۱,۴۶۱,۳۷۴	۳ / ۴۵,۳۵۳,۹۶۰

جدول صورت وضعیت ها

شماره	دوره	مبلغ دوره			مدت زمان پرداخت (روز)
		پیمانکار	کارفرما	پرداختی	
۱	بهمن	۶	۷	۵	۳
۲	اسفند	۳	۶	۵	۳۶
۳	فروردین	۹	۶	۲	۴۷
۴	اردیبهشت	۱	۶	۴	۶۳
۵	خرداد	۶	۹	۶	۶۷
۶	تیر و مرداد	۵	۲		۵۱
۷	شهریور	۵			
مجموع تا کنون:		۵۵	۵۵	۵۵	

* مبالغ به میلیارد تومان میباشند.

شرح	بهمن (ریال)	اسفند (ریال)	فروردین (ریال)	اردیبهشت (ریال)	خرداد (ریال)	تیر (ریال)	مرداد (ریال)	جمع (ریال)
مبلغ خالص دریافتی	۵,۹۸	۵,۲۸	۳,۵۳	۴,۳۲	۶,۰۴	۱,۷	۱,۷	۲۵,۱۵
هزینه تجهیز و بالاسری	۷,۲	۷,۳	۷,۶	۸,۲	۹,۵	۱۰,۱	۱۰,۲	۶۰,۱
نسبت هزینه تجهیز و بالاسری به خالص دریافتی	۱۲۰٪	۱۳۸٪	۲۱۵٪	۱۹۰٪	۱۵۷٪	۵۹۴٪	۶۰۰٪	۲۳۹٪

گزارش تعداد دستگاه های شرکتی و استیجاری آنها در هر ماه تا تاریخ ۱۲/۰۸


درصد کارکرد	تعداد کل	تجمعی	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	وضعیت	دستگاه
۶۳%	۱,۲۳۹	۷۷۷	۱۹	۷۳	۱۲۲	۱۰۴	۱۰۸	۱۱۳	۱۱۹	۱۱۹	فعال	کمپرسی
		۸۳	۳	۸	۷	۱	۲۴	۶	۷	۲۷	غیر فعال	
		۳۷۹	۲۲	۸۲	۳۵	۷۲	۴۷	۶۴	۱۹	۳۸	تعمیری	
۶۶%	۴۸۶	۳۲۲	۶	۲۷	۲۸	۳۱	۴۸	۴۰	۷۴	۶۸	فعال	لودر
		۳۸	۱	۸			۴	۲	۷	۱۶	غیر فعال	
		۱۲۶	۷	۴	۳۲	۳۰	۸	۲۷	۱۲	۶	تعمیری	
۹۰%	۱۰۸	۹۷			۵	۲۷	۲۳	۲۷		۱۵	فعال	بیل مکانیکی
		۱۰				۱	۶			۴	غیر فعال	
		۱					۱				تعمیری	
۴۲%	۴۴۲	۱۸۶	۵	۲۹	۳۰	۲۷	۲۱	۲۳	۲۵	۲۶	فعال	گریدر
		۲۴	۳	۸		۱	۴	۲	۳	۳	غیر فعال	
		۲۳۲	۸	۲۵	۳۰	۳۰	۳۵	۳۳	۳۷	۳۴	تعمیری	
۴۹%	۴۲۹	۲۱۰	۶	۲۴	۲۷	۱۹	۲۳	۲۰	۴۷	۴۴	فعال	غاطک صاف
		۳۰	۲	۱		۲	۴	۵	۴	۱۲	غیر فعال	
		۱۸۹	۸	۳۵	۳۳	۳۸	۳۲	۳۰	۷	۶	تعمیری	
۶۳%	۱۵۸	۱۰۰	۷	۴	۱۵	۲۶	۲۰	۱۵	۱۳		فعال	غاطک پاچه بزی
		۱۷	۱	۲	۲	۲	۶	۲	۲		غیر فعال	
		۴۱		۲۴	۱۳		۱	۳			تعمیری	
۵۳%	۲۱۹	۱۱۶	۳	۱۷	۲۲	۲۸	۱۳	۱۳	۶	۱۴	فعال	تراک میکسر
		۱۰۳	۵	۱۳	۸	۱	۱۷	۱۸	۲۴	۱۷	غیر فعال	
		۰									تعمیری	
۹۵%	۴۳۷	۴۱۵	۱۴	۵۷	۵۸	۵۷	۵۵	۵۷	۵۹	۵۸	فعال	تانکر آب پاش
		۲۰	۲	۲	۲	۱	۵	۳	۱	۴	غیر فعال	
		۲				۲					تعمیری	
۶۶%	۲۱۹	۱۴۴	۵	۲۱	۲۲	۲۳	۲۶	۱۹	۱	۲۷	فعال	جرثقیل
		۲۷		۷	۵	۴	۱۴	۳		۱۴	غیر فعال	
		۴۸	۳	۱	۳	۳		۸	۳۰		تعمیری	
۹۴%	۲۲۰	۲۰۶	۶	۲۹	۳۰	۲۷	۲۷	۲۸	۳۰	۲۹	فعال	تانکر سوخت
		۱۴	۲	۱		۳	۳	۲	۱	۲	غیر فعال	
		۰									تعمیری	
۹۵%	۷۴	۷۰						۱۳	۳۰	۲۷	فعال	تراکتور
		۴							۱	۳	غیر فعال	
		۰									تعمیری	
۶۶%	۴,۰۳۱	۲,۶۴۳	۷۱	۲۸۱	۳۵۹	۳۶۹	۳۶۴	۳۶۸	۴۰۴	۴۲۷	فعال	تعداد تجمعی دستگاه ماه
		۳۷۰	۱۹	۵۰	۲۴	۱۶	۷۷	۴۳	۵۰	۹۱	غیر فعال	
		۱,۰۱۸	۴۸	۱۷۱	۱۴۶	۱۷۵	۱۲۴	۱۶۵	۱۰۵	۸۴	تعمیری	
۶۶%	۱۰۰%	۶۶%	۵۱%	۵۶%	۶۸%	۶۶%	۶۴%	۶۴%	۷۲%	۷۱%	فعال	درصد کارکرد تجمعی ماهانه
		۹%	۱۴%	۱۰%	۵%	۳%	۱۴%	۷%	۹%	۱۵%	غیر فعال	
		۲۵%	۳۵%	۳۴%	۲۸%	۳۱%	۲۲%	۲۹%	۱۹%	۱۴%	تعمیری	


نمودار ماشین آلات سنگین شرکتی تا تاریخ ۱۴۰۸

وضعیت		
Repair	DeActive	Active

ماه			
۰۸	۰۷	۰۶	۰۵
۱۲	۱۱	۱۰	۰۹

دستگاه			
پیل مکانیکی	تانکر سبوت	تانکر آب پاش	تراک هیگدر
جرثقیل	غلطک صاف	غلطک پاچه بزی	کمپرسی
کریدر	لودر		

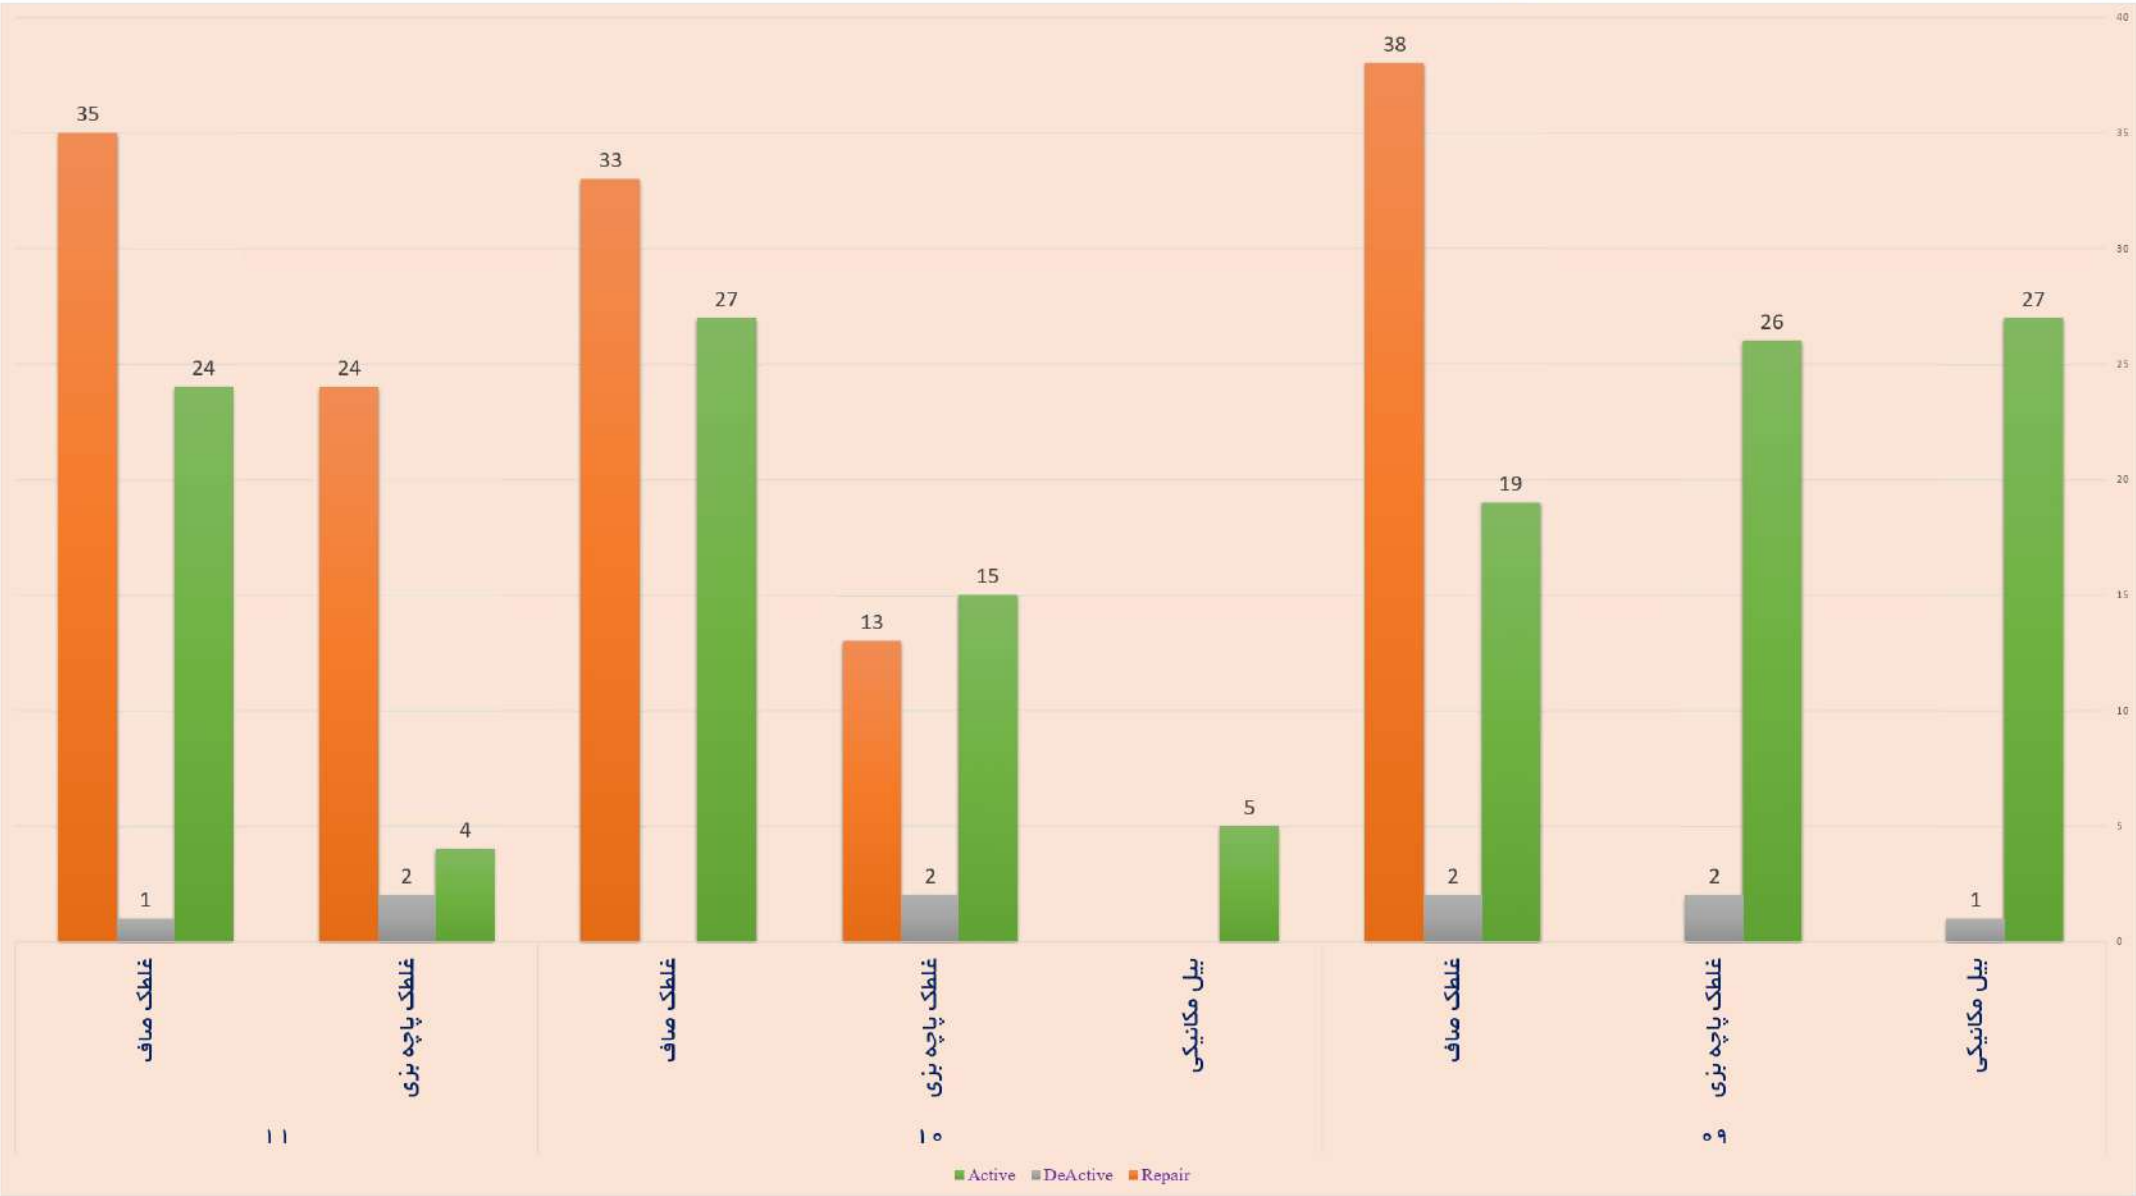

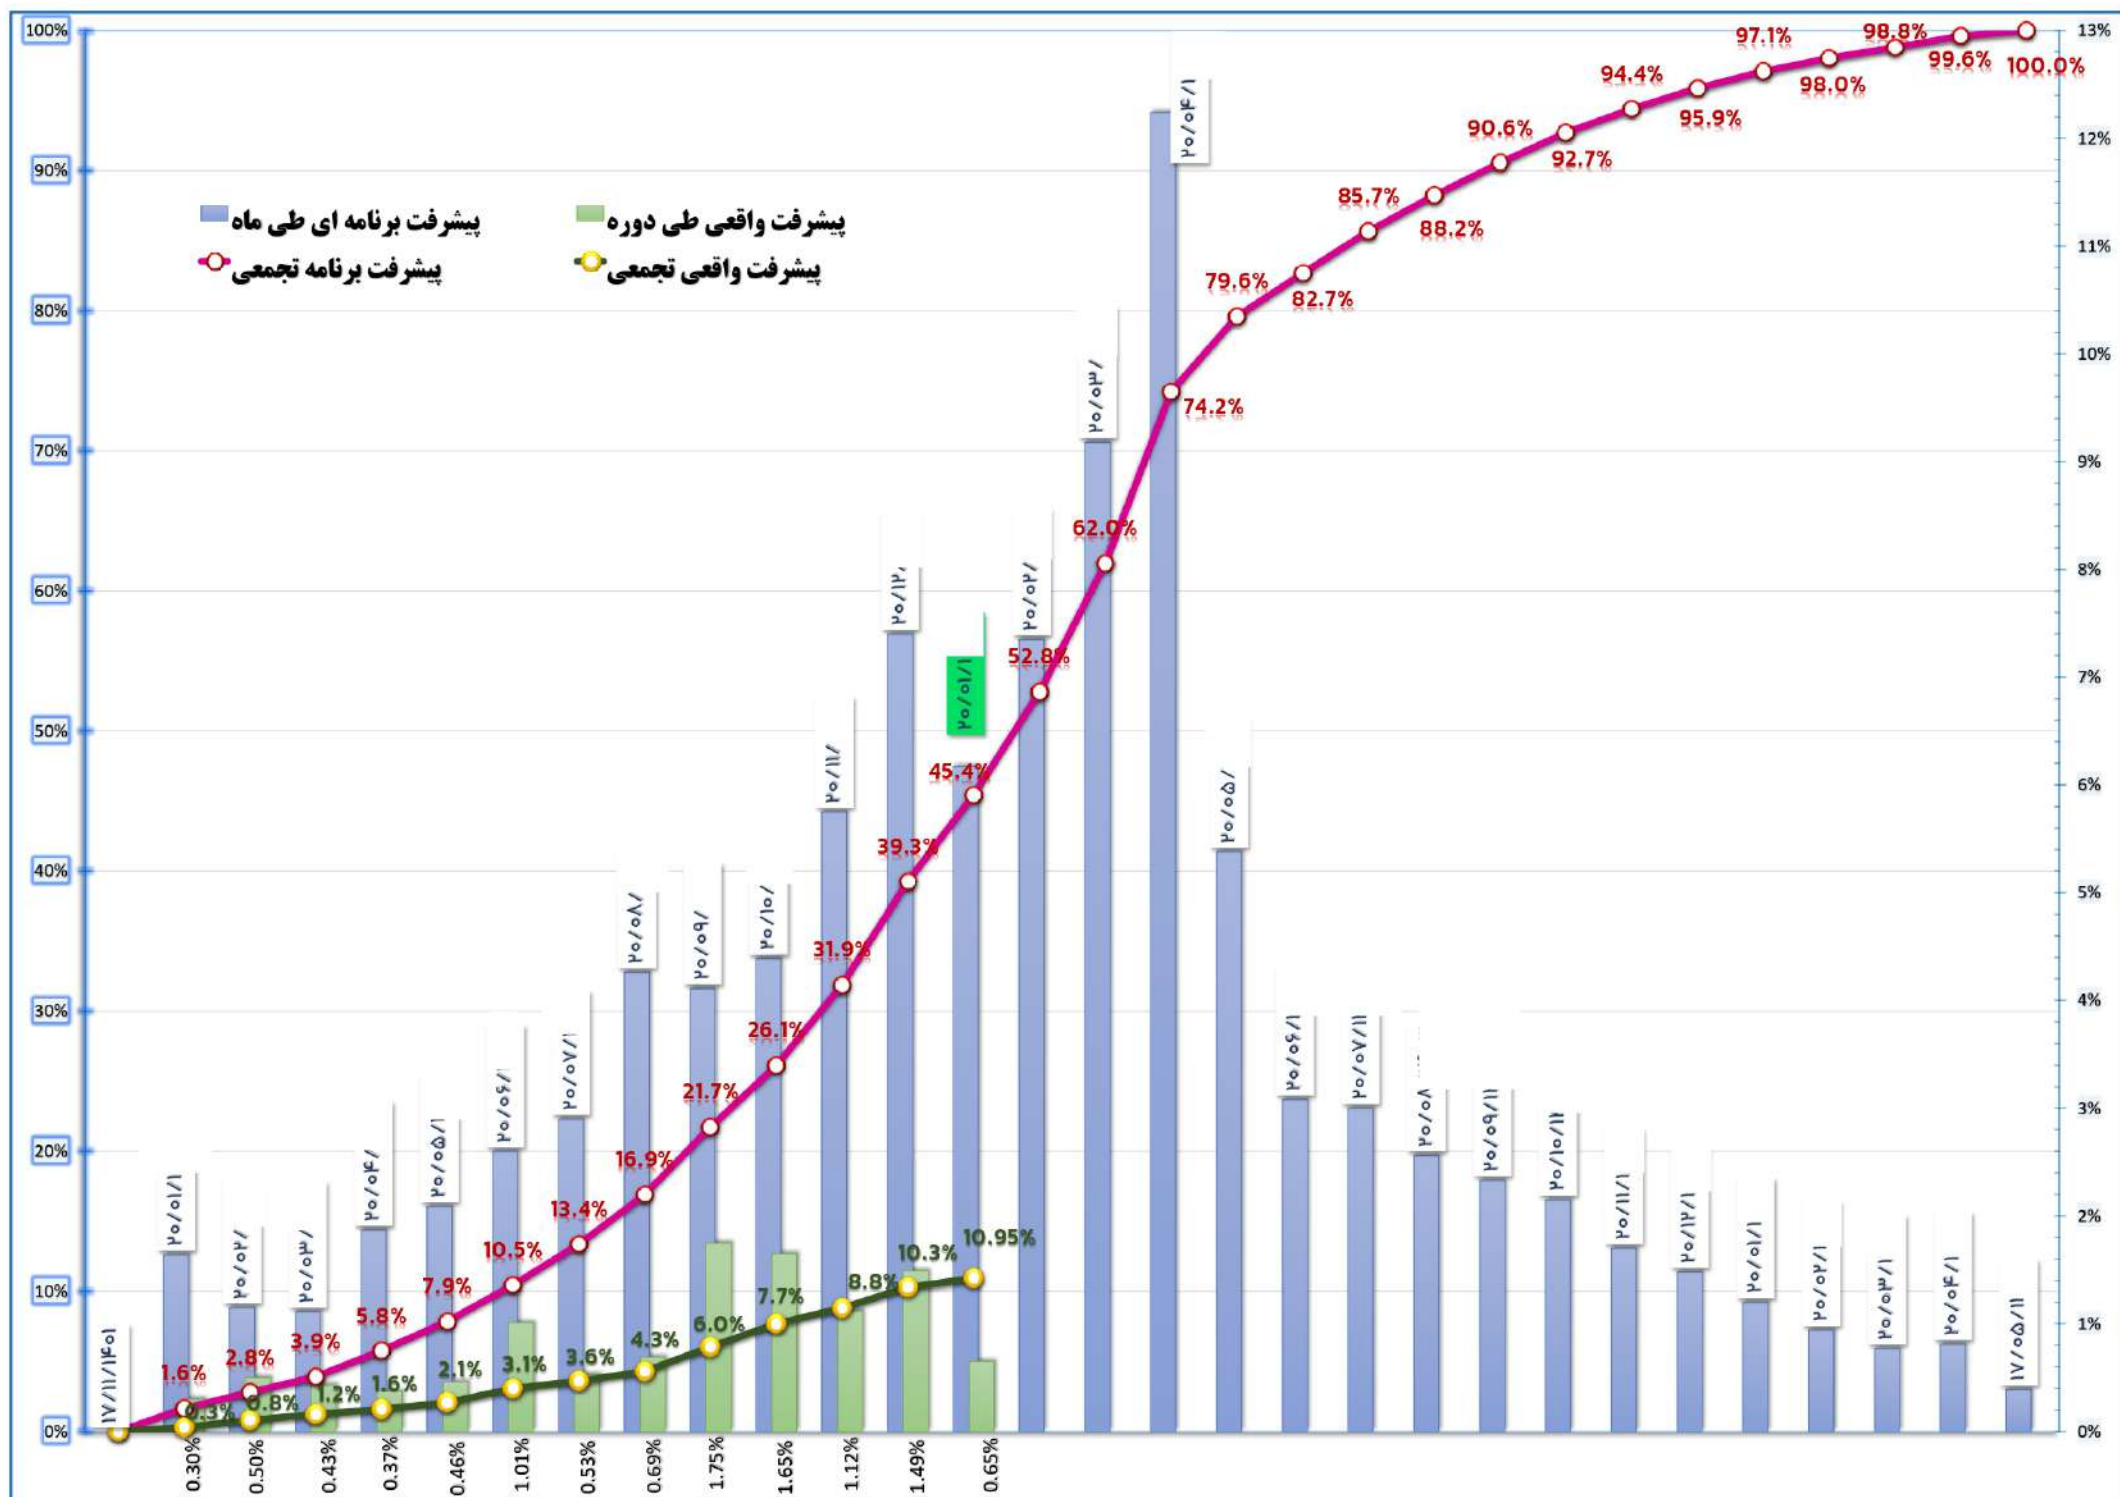


نمودار هفتگی پیشرفت (مترمکعب)


حجم دوره حجم تجمعی



نمودار تولید و نصب دیوار پیش ساخته - تا ۱۲/۲۴

متراژ تولید دوره
متراژ نصب دوره
متراژ تولید تجمعی
متراژ نصب تجمعی

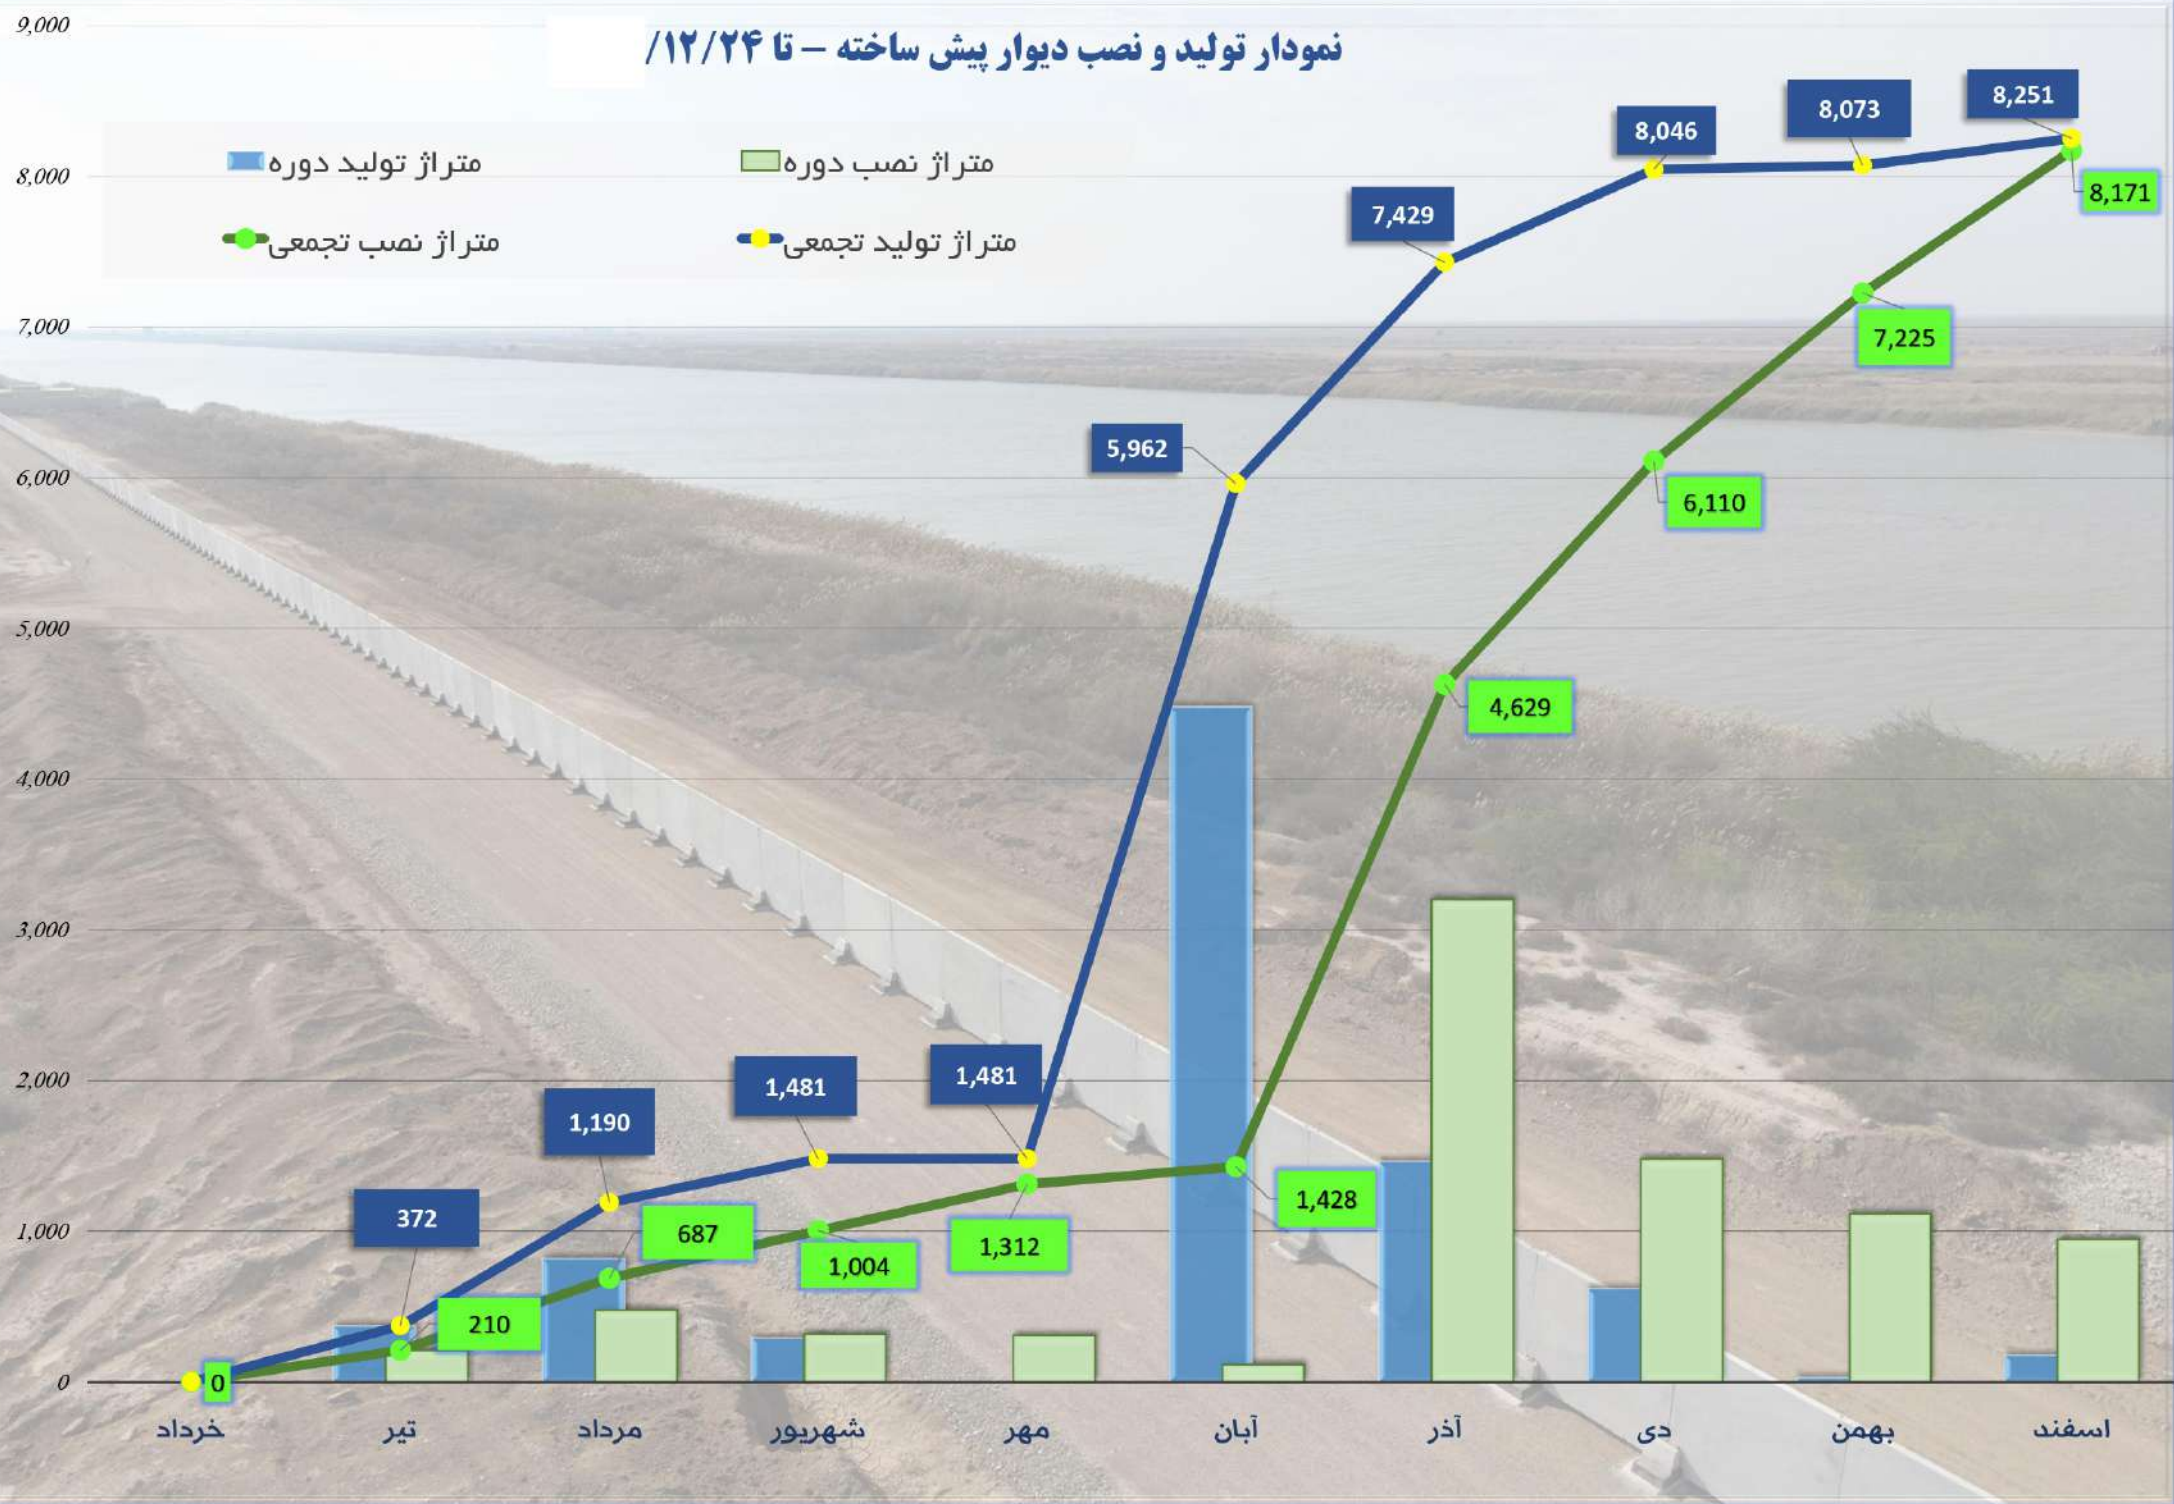

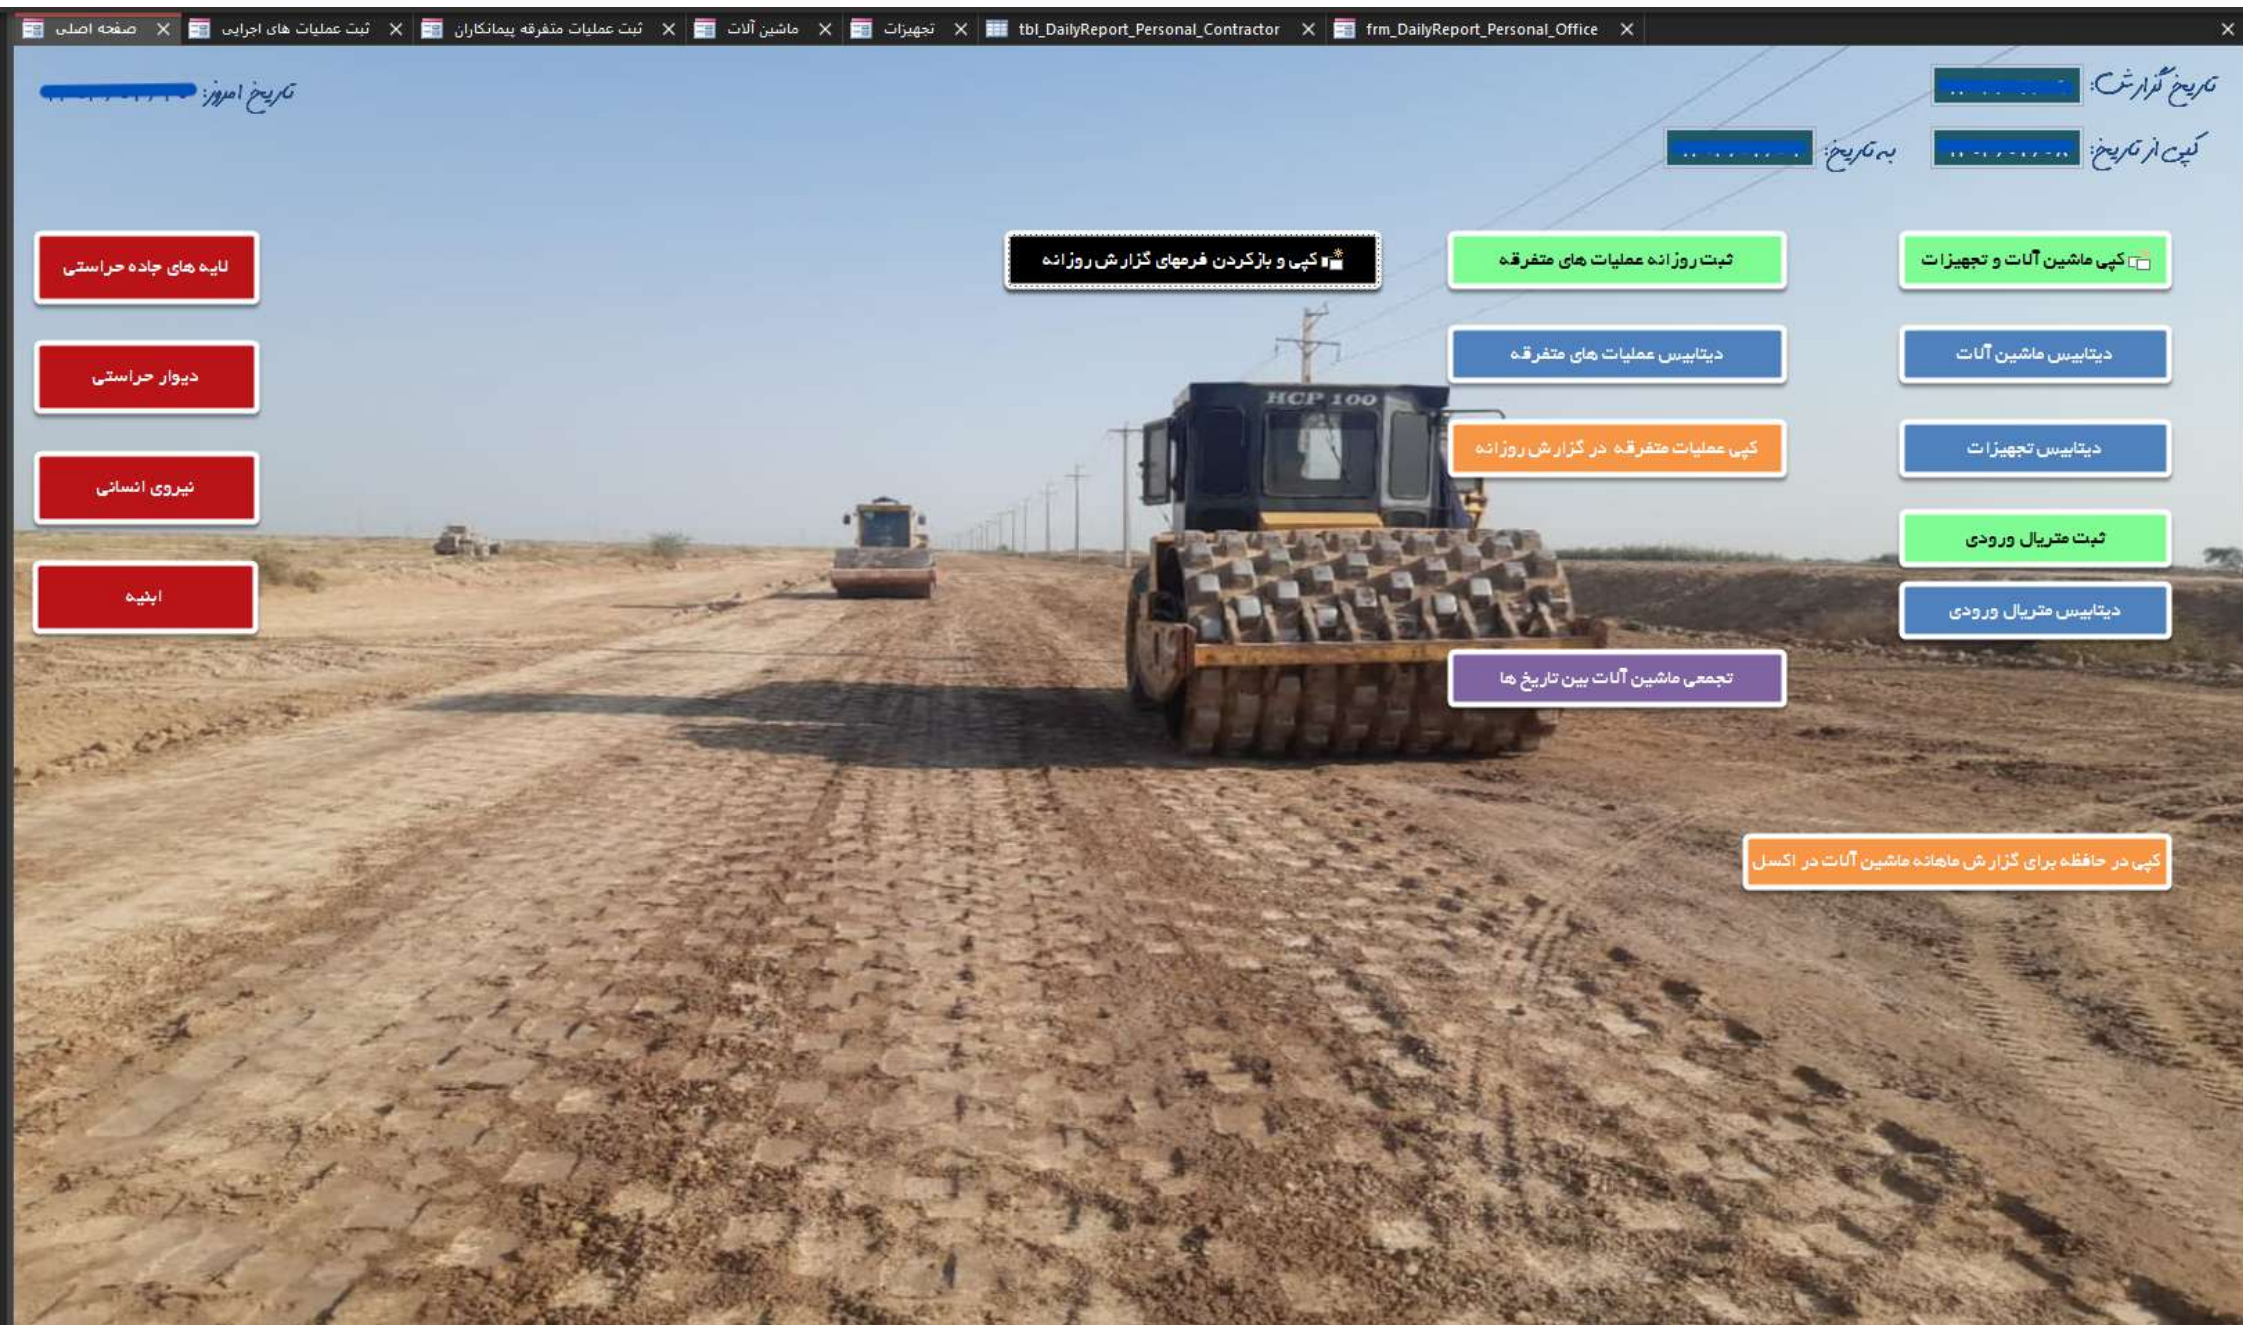

تاریخ گزارش:

اجام کلی فعالیت های اصلی برای هر پکیج

ثبت روزانه عملیات های اصلی

جدول روزانه عملیات های اصلی

جدول تاریخ شروع و پایان عملیات ها

عملیات اصلی برای کپی در گزارش روزانه

مشاهده اجام بین تاریخ ها

تاریخ شروع:

تاریخ پایان:

مشاهده برای گراف کمپ بین تاریخ ها

کپی برای گراف کمپ بین تاریخ ها

حجم کلی و انجام شده فعالیت های اصلی کمپ مسکونی (بین تاریخ ها)

حجم کلی و انجام شده فعالیت های اصلی کمپ (بین تاریخ ها) برای گزارش شناسنامه فنی

دیتابیس اجام عملیات های اصلی

صفحه اصلی

نیروی انسانی

سال

ماه

گروه چارت

کنترل پروژه

تایم شیت ماهانه



لیست روزانه پرسنل شرکت

لیست روزانه پرسنل پیمانکاران

لیست مشاغل مستقیم و غیرمستقیم

اطلاعات کلی پرسنل

لیست مشاغل

تعداد نیروهای مستقیم/غیرمستقیم پیمانکاران انبیه

تعداد نیروهای مستقیم/غیرمستقیم

تعداد کلی نیروهای مستقیم/غیرمستقیم

تعداد کلی نیروهای روزانه (اکسل)

گزارش نفرروز شرکت و پیمانکار تامین نیرو (از تاریخ - به تاریخ)

گزارش نفرروز پیمانکاران (از تاریخ - به تاریخ)

گزارش کلی نفرروز (از تاریخ - به تاریخ)

گزارش کلی نفرروز (از تاریخ - به تاریخ) برای هر پیمانکار (مستقیم)

گزارش کلی نفرروز (از تاریخ - به تاریخ) برای کلیه پیمانکاران

تعداد نیروها در یک روز (تاریخ گزارش) برای گزارش ماهانه

۱-کپی پرسنل شرکت و پیمانکاران

۲-ورود آمار اداری به جدول (تاریخ گزارش)

۳-آپدیت پرسنل شرکت از اداری (تاریخ گزارش)

۴-پر کردن جدول آمار مستقیم و غیر مستقیم

۴-آپدیت مجدد جدول آمار مستقیم و غیر مستقیم

۵-آپدیت روزهای تعطیل کاری (تاریخ گزارش)

کپی از تاریخ:

به تاریخ:

تغییل کاری: اگر تاریخ باکس "به تاریخ" تعطیل بود ۱ بذار

تاریخ گزارش:

لیست نفرات شرکتی (مستقیم و غیرمستقیم)

لیست نفرات پیمانکاران (مستقیم و غیرمستقیم)

پرسنل شرکت





جهت ورود اطلاعات هر عملیات، روی آیتمهای "شرح عملیات" کلیک کنید.

شرح عملیات	موقعیت	پیشرفت	مجری
بتن مگر فونداسیون	L۰۱	۱۰۰%	راهسازی و عم
آرماتوربندی فونداسیون	L۰۱	۱۰۰%	مینا گستران ف
قالب بندی فونداسیون	L۰۱	۱۰۰%	مینا گستران ف
بتن ریزی فونداسیون	L۰۱	۱۰۰%	مینا گستران ف
آرماتوربندی ستونها	L۰۱	۱۰۰%	مینا گستران ف
قالب بندی ستونها	L۰۱	۱۰۰%	مینا گستران ف
بتن ریزی ستونها	L۰۱	۱۰۰%	مینا گستران ف
آرماتوربندی تیر سقف	L۰۱	۱۰۰%	مینا گستران ف
آرماتوربندی دال سقف	L۰۱	۱۰۰%	مینا گستران ف
قالب بندی تیر سقف	L۰۱	۱۰۰%	مینا گستران ف
قالب بندی دال سقف	L۰۱	۱۰۰%	مینا گستران ف
بتن ریزی سقف	L۰۱	۱۰۰%	مینا گستران ف
آرماتوربندی جانیته	L۰۱	۱۰۰%	مینا گستران ف
قالب بندی جانیته	L۰۱	۷۵%	مینا گستران ف
بتن ریزی جانیته	L۰۱		مینا گستران ف
شیب بندی بام	L۰۱		مینا گستران ف
ساخت وال پست دیوار	L۰۱	۱۰۰%	مینا گستران ف
نصب وال پست دیوار	L۰۱	۱۰۰%	مینا گستران ف
گرسی چینی دیوار	L۰۱	۱۰۰%	مینا گستران ف
عایق کاری روی گرسی ساختمان	L۰۱		مینا گستران ف
بلوکاز کف ساختمان	L۰۱	۱۰۰%	مینا گستران ف
دیوار چینی	L۰۱	۳۵%	مینا گستران ف
بتن ریزی کف	L۰۱		مینا گستران ف
نصب چارچوب و فریم درب و پنجره	L۰۱		مینا گستران ف
شیب بندی سرویسها و آشپزخانه	L۰۱		مینا گستران ف
عایق کاری سرویسها و آشپزخانه	L۰۱		مینا گستران ف
سیمانکاری آستر بیرونی	L۰۱		مینا گستران ف
اجرای نمای روبه	L۰۱		مینا گستران ف
گچ کاری	L۰۱		مینا گستران ف
آستر گچی	L۰۱		مینا گستران ف
رنگ آمیزی	L۰۱		مینا گستران ف
سیمانکاری آستر داخلی	L۰۱		مینا گستران ف
کاشی کاری دیوار سرویس ها	L۰۱		مینا گستران ف
کاشی کاری دیوار آشپزخانه	L۰۱		مینا گستران ف
تهیه و اجرای سقف کاذب	L۰۱		مینا گستران ف
تهیه و اجرای سقف گتاف	L۰۱		مینا گستران ف
کف سازی سرویسها	L۰۱		مینا گستران ف
کف سازی آشپزخانه	L۰۱		مینا گستران ف

جدید

۷۸.۶

حجم کل

M2

واحد

۷۵.۰%

انجام شده تا روز قبل

درصد انجام شده امروز

حجم روزانه

به ازای یک متر

شمار روزانه به ازای یک متر

تکمیل عملیات

مشاهده کارکرد روزانه فعالیت

موقعیت

منطقه

G۰۱

G۰۲

H۰۱

H۰۲

I۰۱

I۰۲

J۰۱

J۰۲

K۰۱

K۰۲

L۰۱

L۰۲

ساختمان

ساختمان

سایت

سیستم روشنایی

پارکینگ - ۲۴ واحدی

کمون - ۲۴ واحدی

پارکینگ

محوطه سازی

محوطه سازی

شرح عملیات

توضیحات

احجام و تاریخ شروع و پایان انجام شده

لیست عملیات روزانه

◀

📅

✂

▶

📁

چگونگی انجام روزانه لایه ها

ثبت اتمام روزانه لایه ها

متر از کلی لایه ها برای گراف

درصد پیشرفت هر لایه

درصد پیشرفت کلی لایه های جاده

ثبت اتمام کار شده

جدید

متر از کار شده

0 _ 1450
1550 _ 8206

متر از شروع

۱۴۵۰

متر از پایان

۱۴۵۰

☐ انجام شده

جنس لایه

توپکا
پیندر
بیس
دوم ساپینس
اول ساپینس
سوم تونال
دوم تونال
اول تونال
دوم خاک و آهک
اول خاک و آهک
ششم خاکریز
پنجم خاکریز
چهارم خاکریز
سوم خاکریز
دوم خاکریز
اول خاکریز
کل لایه های خاکی
بستر

تاریخ

عملیات

بارریزی
بارریزی و پخش
بارریزی، پخش و کوبش
بارریزی، پخش و میکس
بارریزی، پخش، رگلاژ
بارریزی، پخش، رگلاژ و کوبش
بارریزی، میکس، پخش، رگلاژ و کوبش
بارگیری
پخش
پخش و میکس
پخش و رگلاژ
پخش، میکس و رگلاژ
پخش، رگلاژ و کوبش
پخش، میکس، رگلاژ و کوبش
خاکریزی و تسطیح
رگلاژ
رگلاژ و کوبش
کوبش
لایرونی
لجن برداری
میکس
میکس، پخش

مشاهده اتمام ماهانه لایه ها

تاریخ شروع:

تاریخ پایان:

ردیف	پرسنل	تاریخ																													توضیحات	اموریت	مرخصی	تعطیل کاری	اموریت
		۳۱	۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۰۹	۰۸	۰۷	۰۶	۰۵	۰۴	۰۳					
۱- س	۴																																		۳
۲- فر	۲																																		۱۱
۳- م	۹																																		۲
۴- م	۵																																		۱
۵- می	۰																																		۱

عملیات اجرایی	موقعیت	مقدار حجم	واحد	حجم انجام شده	درصد انجام شده	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شناسه فعالیت اصلی
بتن ریزی کف A01	A01	9.85	M3	1.0	10%	1387/01/08	1387/01/08	بتن ریزی
بلوکاز کف ساختمان A01	A01	76.82	M3	15.4	20%	1387/12/10	1387/12/10	بلوکاز
تهیه و اجرای لوله کشی فاضلاب A01	A01		M		100%	1387/01/25	1387/01/25	لوله کشی فاضلاب
دیوار چینی A01	A01	201.59	M2	201.6	100%	1387/12/16	1387/12/09	بلوک چینی
نصب چارچوب و فریم درب و پنجره A01	A01		Kg		70%	1387/12/16	1387/12/16	چارچوب درب و پنجره
آستر گچی A02	A02		M2		100%	1387/01/18	1387/01/09	گچ کاری
شیب بندی بام A02	A02	201.00	M2	201.0	100%	1387/01/30	1387/01/25	شیب بندی
نصب چارچوب و فریم درب و پنجره A02	A02		Kg		20%	1387/12/26	1387/12/20	چارچوب درب و پنجره
نصبیات شامل کلید بریز ها، هواکش ها و روشنایی A02	A02		Pcs		20%	1387/12/23	1387/12/22	نصبیات برقی
آرما توربندی جانپناه B01	B01	82.00	Kg	82.0	100%	1387/12/10	1387/12/08	آرما توربندی
آرما توربندی دال سقف B01	B01	831.90	Kg	499.1	60%	1387/12/07	1387/12/05	آرما توربندی
بتن ریزی سقف B01	B01	24.98	M3	25.0	100%	1387/12/14	1387/12/14	بتن ریزی
تهیه و اجرای لوله کشی فاضلاب B01	B01		M		20%	1387/12/10	1387/12/10	لوله کشی فاضلاب
بتن ریزی کف B02	B02	16.86	M3	8.4	50%	1387/12/25	1387/12/10	بتن ریزی
تهیه و اجرای لوله کشی برق B02	B02		M		100%	1387/12/27	1387/12/25	لوله کشی برق
تهیه و اجرای لوله کشی فاضلاب B02	B02		M		100%	1387/12/14	1387/12/13	لوله کشی فاضلاب
دیوار چینی B02	B02	264.88	M2	26.5	10%	1387/12/07	1387/12/07	بلوک چینی
قالب بندی جانپناه B02	B02	91.04	M2	91.0	100%	1387/12/16	1387/12/14	قالب بندی
بلوکاز کف ساختمان C01	C01	76.82	M3	46.1	60%	1387/01/29	1387/01/28	بلوکاز
عایق کاری روی کرسی ساختمان C01	C01	47.50	M2	47.5	100%	1387/01/19	1387/01/19	عایق کاری
نصب وال پست دیوار C01	C01	470.00	Kg	164.5	35%	1387/12/09	1387/12/05	وال پست
کرسی چینی دیوار C01	C01	10.29	M3	8.2	80%	1387/12/24	1387/12/17	کرسی چینی
آستر گچی C02	C02		M2		100%	1387/01/18	1387/01/11	گچ کاری
بتن ریزی جانپناه C02	C02	5.69	M3	5.7	100%	1387/01/27	1387/01/27	بتن ریزی
تهیه و اجرای لوله کشی برق C02	C02		M		100%	1387/12/25	1387/12/22	لوله کشی برق
شیب بندی بام C02	C02	201.00	M2	201.0	100%	1387/02/08	1387/01/08	شیب بندی
قالب بندی جانپناه C02	C02	91.04	M2	91.0	100%	1387/12/20	1387/12/14	قالب بندی
نصب چارچوب و فریم درب و پنجره C02	C02		Kg		80%	1387/01/27	1387/01/27	چارچوب درب و پنجره
ساخت وال پست دیوار D01	D01	1,098.00	Kg	878.4	80%	1387/12/13	1387/12/05	وال پست
شیب بندی بام D01	D01	156.00	M2	78.0	50%	1387/02/09	1387/02/09	شیب بندی
نصب وال پست دیوار D01	D01	470.00	Kg	423.0	90%	1387/02/05	1387/12/05	وال پست
بلوکاز کف ساختمان D02	D02	131.53	M3	131.5	100%	1387/01/19	1387/12/23	بلوکاز
دیوار چینی D02	D02	264.88	M2	251.6	95%	1387/01/29	1387/01/20	بلوک چینی
عایق کاری روی کرسی ساختمان D02	D02	63.45	M2	63.5	100%	1387/12/19	1387/12/17	عایق کاری
نصب چارچوب و فریم درب و پنجره D02	D02		Kg		80%	1387/01/28	1387/01/28	چارچوب درب و پنجره
کرسی چینی دیوار D02	D02	14.44	M3	14.4	100%	1387/12/15	1387/12/10	کرسی چینی
بلوکاز کف ساختمان E02	E02	131.53	M3	131.5	100%	1387/12/19	1387/12/05	بلوکاز
تهیه و اجرای لوله کشی فاضلاب E02	E02		M		60%	1387/02/09	1387/02/09	لوله کشی فاضلاب
دیوار چینی E02	E02	264.88	M2	264.9	100%	1387/12/27	1387/12/19	بلوک چینی
عایق کاری روی کرسی ساختمان E02	E02	63.45	M2	31.7	50%	1387/12/16	1387/12/16	عایق کاری
نصب چارچوب و فریم درب و پنجره E02	E02		Kg		70%	1387/12/23	1387/12/23	چارچوب درب و پنجره
قالب بندی جانپناه F01	F01	78.56	M2	11.8	15%	1387/12/23	1387/12/23	قالب بندی
آستر گچی F02	F02		M2		90%	1387/01/31	1387/01/22	گچ کاری
بتن ریزی کف F02	F02	16.86	M3	13.5	80%	1387/12/11	1387/12/11	بتن ریزی
بلوکاز کف ساختمان F02	F02	131.53	M3	13.2	10%	1387/12/11	1387/12/11	بلوکاز

عکسهای پروژه

۴۰

تعداد قرارداد ها

موضوع پروژه:

اجرای عملیات سیویل و ساختمانی کارخانه



شرکت مهندسی

کارفرما:

کارخانه



دستگاه نظارت:

مهندسین مشاور



شرکت مهندسی و مدیریت

پیشرفت مالی ۸۴%

۴۶,۵۸۱,۲۱۷,۸۶۷

تعدیل

۱۴

۱۴۲,۸۸۹,۲۷۲,۳۲۳

کارکرد

۱۴

مابه التفاوت

۰

مجموع: ۱۸۹,۴۷۰,۴۹۰,۱۹۰

شروع قرارداد

پایان قرارداد

شروع تمدید

پایان تمدید

پایان پروژه

توضیحات

نام کارگاه

نام پوشه

Abnie_

کد قراردادهای پیمانکاران

۲

سهم

۱۰۰%

صورت وضعیت  صورت وضعیت 

لیست کارکرد  لیست کارکرد 

چاپ همه فرمها  فرم گردش ص و 

☐ این صورت وضعیت قطعی است

شماره پوینت :

تاریخ ثبت :

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

ناخالص تجمعی ۷۷۶,۱۸۹,۱۰۰

حسن انجام کار ۱۰٪ ۱۳,۱۰۲,۴۱۰

تعهدات ۵٪

بیمه ۵٪

مالیات ۵٪

توضیح سایر کسورات

جمع کسورات ۱۳,۱۰۲,۴۱۰

خالص پرداختی ۱۱۷,۹۲۱,۶۹۰

شماره صورت وضعیت ۲

مبلغ ناخالص ۱۳۱,۰۲۴,۱۰۰

پیش پرداخت

سوخت

خوراک

سایر کسورات

مبالغ ورودی 

مبالغ ورودی 

بستن 

حذف 

انصراف

جدید 

ذخیره 

[illegible]

جستجو بر اساس ID	۱۴۷	ID
شماره صورتجلسه	۱۳	تاریخ
میکروسلیس	شرکت اس	خریدار
میزبانی	۴۰۰	مجموع
مقدار میزبانی	۵	مقدار محصول
کیلوگرم	۶۰۷	متر مکعب
بهای میزبانی	۸۸۰۳۲۷ ریال	بهای محصول
بهای کل میزبانی	۴۴۱۰۶۳۵ ریال	بهای کل محصول
۸۰۸۹۳۰۸۶۷ ریال		
شرح		
<div> <div>←</div> <div>📄</div> <div>🔍</div> <div>→</div> </div>		<input checked="" type="checkbox"/> درج در صورتجلسه
تعداد باسکول		۱
مجموع باسکول		

ردیف	پروژه	پرسنل	ماشین آلات	تجهیزات	مصارف مصرفی	فعالیت روزانه	گزارشات	مکاتبات	قراردادها	ابزار	فرمها	ساختار شکست			
ردیف	ID	تاریخ	ش صورتجلسه	پیمانکاران کارفرما	معمول	مقدار محصول	واحد	بهای محصول	بهای کل محصول	متریال	مقدار متریال	واحد	بهای متریال	بهای کل متریال	بهای مجموع
مجموع مصالح ورودی	۱۴۲	۰۴/۱۷	۱۲	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۱۵۰	۴.۱۴	مترمکعب	۱.۲۷۸.۰۴۹ ریال	۵.۲۹۱.۱۲۳					۵.۲۹۱.۱۲۳.۶۹	
مصالح پیمانکاران غیر قرارداد	۱۴۸	۰۴/۱۲	۱۳	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۱۷.۵۷	مترمکعب	۱.۴۶۵.۲۱۷ ریال	۲۵.۷۴۳.۸۶۲					۲۵.۷۴۳.۸۶۲.۴۴	
مصالح پیمانکاران قراردادی	۱۴۷	۰۴/۱۲	۱۳	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۶.۰۷	مترمکعب	۱.۴۶۵.۲۱۷ ریال	۸.۸۹۳.۸۶۷	میکروسیلیس	۵	کیلوگرم	۸۸۵.۳۲۷ ریال	۴۴۱.۶۳۵	۹.۳۳۵.۵۰۲.۴۴
ورود مصالح مابین تاریخ	۱۳۶	۰۴/۱۲	۱۰	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۱۲.۲۲	مترمکعب	۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال	۱۸.۳۳۰.۰۰۰					۱۸.۳۳۰.۰۰۰.۴۰	
فروش محصولات	۱۳۵	۰۴/۰۵	۱۰	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۱۷۸.۲۴	مترمکعب	۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال	۲۳۱.۷۱۲.۰۰۷					۲۳۱.۷۱۲.۰۰۷.۱۴	
لیست فروش محصولات	۱۳۲	۰۴/۰۴	۱۰	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۱۰۰	۲۸.۵۱	مترمکعب	۱.۰۵۰.۰۰۰ ریال	۲۹.۹۳۵.۴۹۸					۲۹.۹۳۵.۴۹۸.۲۴	
صورتحساب محصولات	۱۴۶	۰۴/۰۳	۱۳	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۱۵۰	۲.۶۶	مترمکعب	۱.۲۷۸.۰۴۹ ریال	۳.۲۹۹.۶۱۰					۳.۲۹۹.۶۱۰.۴۵	
بهای محصولات و متریال	۱۴۵	۰۳/۲۸	۱۳	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۴.۶۶	مترمکعب	۱.۴۶۵.۲۱۷ ریال	۶.۸۲۷.۹۱۱					۶.۸۲۷.۹۱۱.۰۰	
جزئیات کل فروش	۱۴۳	۰۳/۲۲	۱۳	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۱۷.۵۴	مترمکعب	۱.۴۶۵.۲۱۷ ریال	۲۵.۶۹۹.۰۰۸	میکروسیلیس	۲۵	کیلوگرم	۸۸۵.۳۲۷ ریال	۲.۲۰۸.۱۷۵	۲۷.۹۰۸.۸۲.۵۲
	۱۳۳	۰۳/۲۲	۱۳	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۴.۶۸	مترمکعب	۱.۴۶۵.۲۱۷ ریال	۶.۸۵۷.۲۱۵					۶.۸۵۷.۲۱۵.۳۱	
	۱۳۴	۰۳/۱۲	۱۰	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۲۴.۵۴	مترمکعب	۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال	۳۱.۹۰۲.۰۰۱					۳۱.۹۰۲.۰۰۱.۱۹	
	۱۴۱	۰۳/۰۹	۱۳	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۳.۰۸	مترمکعب	۱.۴۶۵.۲۱۷ ریال	۴.۵۱۴.۸۶۸					۴.۵۱۴.۸۶۸.۲۵	
	۱۳۳	۰۳/۰۷	۱۰	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۳۳.۲	مترمکعب	۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال	۴۳.۱۶۰.۰۰۱					۴۳.۱۶۰.۰۰۰.۹۹	
	۱۲۴	۰۲/۳۱	۱۱	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۸.۱۳	مترمکعب	۱.۴۶۵.۲۱۷ ریال	۱۱.۹۱۲.۲۱۴					۱۱.۹۱۲.۲۱۴.۳۸	
	۱۲۳	۰۲/۰۷	۱۱	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۶.۸	مترمکعب	۱.۴۶۵.۲۱۷ ریال	۹.۹۶۳.۴۷۶					۹.۹۶۳.۴۷۵.۸۸	
	۱۲۲	۰۲/۰۲	۱۱	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۲۵۰	۵.۹۸	مترمکعب	۱.۳۵۸.۱۳۹ ریال	۸.۱۲۱.۶۷۱					۸.۱۲۱.۶۷۱.۲۵	
	۱۲۱	۰۲/۰۱	۱۱	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۲۵۰	۹.۶۷	مترمکعب	۱.۳۵۸.۱۳۹ ریال	۱۳.۵۸۹.۹۴۹					۱۳.۵۸۹.۹۴۹.۱۵	
	۱۲۰	۰۱/۳۱		شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۹.۲	مترمکعب	۱.۴۶۵.۲۱۷ ریال	۱۳.۴۷۹.۹۹۶	میکروسیلیس	۲۵	کیلوگرم	۸۵۰.۰۰۰ ریال	۲.۱۲۵.۰۰۰	۱۵.۶۰۴.۹۹۶.۱۲
	۱۱۹	۰۱/۲۷	۱۱	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۲۵۰	۱۲.۲۲	مترمکعب	۱.۳۵۸.۱۳۹ ریال	۱۶.۷۳۲.۲۷۲					۱۶.۷۳۲.۲۷۲.۰۷	
	۱۱۷	۰۱/۲۴	۱۱	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۲۵۰	۸.۰۳	مترمکعب	۱.۳۵۸.۱۳۹ ریال	۱۰.۹۰۵.۸۵۶					۱۰.۹۰۵.۸۵۵.۸۱	
	۱۱۸	۰۱/۲۴		شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۴.۶	مترمکعب	۱.۴۶۵.۲۱۷ ریال	۶.۷۳۹.۹۹۸					۶.۷۳۹.۹۹۸.۰۶	
	۱۱۴	۱۲/۲۳	۱۰	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۸۹.۳۵	مترمکعب	۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال	۱۱۶.۱۵۴.۹۹۸					۱۱۶.۱۵۴.۹۹۸.۰۲	
	۱۱۳	۱۲/۲۲	۱۱	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۴.۴۵	مترمکعب	۱.۲۸۲.۶۰۸ ریال	۵.۷۰۷.۶۰۵					۵.۷۰۷.۶۰۵.۳۶	
	۱۱۲	۱۲/۲۰	۱۱	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۵.۰۳	مترمکعب	۱.۲۸۲.۶۰۸ ریال	۶.۴۵۱.۵۱۹					۶.۴۵۱.۵۱۸.۵۱	
	۱۱۱	۱۲/۱۶		شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۵.۰۵	مترمکعب	۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال	۶.۵۶۵.۰۰۰					۶.۵۶۵.۰۰۰.۲۵	
	۱۱۰	۱۲/۱۵	۱۱	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۱۶.۲۳	مترمکعب	۱.۲۸۲.۶۰۸ ریال	۲۰.۸۱۶.۷۲۷	میکروسیلیس	۲۵	کیلوگرم	۸۵۰.۰۰۰ ریال	۲.۱۲۵.۰۰۰	۲۲.۹۴۱.۷۲۷.۲۵
	۱۰۷	۱۲/۱۳	۱۰	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۳۶۹.۴۵	مترمکعب	۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال	۳۵۰.۲۸۵.۰۱۶	افزودنی واتر پروف	۲۳۴	کیلوگرم	۸۹.۴۹۷ ریال	۲۰.۹۶۲.۲۹۸	۳۷۱.۲۲۷.۳۱۳.۸۷
	۱۰۶	۱۲/۱۲	۱۱	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۴.۴۳	مترمکعب	۱.۲۸۲.۶۰۸ ریال	۵.۶۸۱.۹۵۳					۵.۶۸۱.۹۵۳.۲۲	
	۱۰۵	۱۲/۱۲	۱۱	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۶.۸۱	مترمکعب	۱.۲۸۲.۶۰۸ ریال	۸.۷۳۴.۵۶۰	میکروسیلیس	۱۲.۵	کیلوگرم	۸۵۰.۰۰۰ ریال	۱۰.۶۲.۵۰۰	۹.۷۹۷.۰۶۰.۴۱
	۱۰۴	۱۲/۱۱	۱۱	شرکت پارس آریا	بتن عیار ۴۰۰	۱۰.۸۹	مترمکعب	۱.۲۸۲.۶۰۸ ریال	۱۳.۹۶۷.۶۰۲	سک و سلسب	۱۲.۵	کله گ م	۸۵۰.۰۰۰ مال	۱۰.۶۲.۵۰۰	۱۵.۰۳۰.۱۰۱.۵۶
Total									۲.۹۶۰.۹۶۱.۵۸۶				۱۱۶.۴۲۹.۰۳۸	۳۰.۷۷.۳۹۰.۶۲۴.۱۲	

Record: 14 of 109

Unfiltered

Search

مصالح ورودی به کارگاه

نوسط آقای/شرکت: 							
از لغایت 							
مصالح: شن ۳/۴							
واحد: تن							
بهای واحد: ریال ۵۱۰,۰۰۰							
ردیف	شماره سند	تاریخ ورود	وزن پر	وزن خالی	وزن خالص	شماره ماشین	بهای کل
(۱)	۴۵	۰۵/۰۲/	۴۶.۹۶	۱۸.۶۸	۲۸.۲۸	۸۸۵۱۹	۱۴,۴۲۲,۸۰۰
(۲)	۴۸	۰۵/۰۲/	۴۷.۴۶	۱۹.۰۸	۲۸.۳۸	۳۴۱۲۴	۱۴,۴۷۳,۸۰۰
(۳)	۴۹	۰۵/۰۲/	۴۶.۸۰	۱۸.۵۱	۲۸.۲۹	۷۴۳۶۵	۱۴,۴۲۷,۹۰۰
(۴)	۵۱	۰۵/۰۲/	۴۷.۱۲	۱۸.۷۰	۲۸.۴۲	۲۵۶۵۴	۱۴,۴۹۴,۲۰۰
(۵)	۵۲	۰۵/۰۵/	۴۷.۶۶	۱۸.۳۵	۲۹.۳۱	۱۱۷۴۸	۱۴,۹۴۸,۱۰۰
					۱۴۲,۶۸		ریال ۷۲,۷۶۶,۸۰۰
مصالح: شن ۳/۸							
واحد: تن							
بهای واحد: ریال ۵۱۰,۰۰۰							
ردیف	شماره سند	تاریخ ورود	وزن پر	وزن خالی	وزن خالص	شماره ماشین	بهای کل
(۱)	۴۶	۰۵/۰۲/	۴۶.۱۸	۱۸.۵۶	۲۷.۶۲	۱۶۸۶۲	۱۴,۰۸۶,۲۰۰
(۲)	۴۷	۰۵/۰۲/	۴۷.۵۰	۱۸.۵۰	۲۹.۰۰	۳۱۶۸۶	۱۴,۷۹۰,۰۰۰
(۳)	۵۰	۰۵/۰۲/	۴۷.۳۰	۱۹.۴۹	۲۷.۸۱	۲۱۴۸۱	۱۴,۱۸۳,۱۰۰
(۴)	۵۳	۰۵/۰۷/	۴۸.۴۶	۱۸.۴۶	۲۹.۸۰	۱۱۷۴۸	۱۵,۱۹۸,۰۰۰
					۱۱۴,۲۳		ریال ۵۸,۳۵۷,۳۰۰
مجموع بهای کل:							ریال ۱۳۱,۰۲۴,۱۰۰
مبلغ به حروف: یکصد و سی و یک میلیون و بیست و چهار هزار و یکصد ریال							



سه شنبه ۳۰ آوریل ۱۳۹۴

۰۰:۰۰ / ۰۲ / ۱۱

اطلاعات

افراد در حال مرخصی

پایان کارت بهداشت

متولدین این ماه

Activities



پرستل

لیست

فرم

حضور

تایم شیت

مرخصی

لیست

فرم

جعبه های کاری

لیست

فرم

لیست TBM

انومالی

لیست

انومالی باز

بدون دستور

پرمخاطره ترین پرستل

آموزش

لیست

فرم

بازرسی مکان ها

لیست

فرم

بازرسی دستگاه ها

لیست

فرم

بازرسی تجهیزات

لیست

فرم

شرکت [Redacted] (نامی خاص)

مهندسی و اجرای ساختمان و صنعت

PDF



پروژه: [Redacted]

[Redacted]

Inspection			Meeting	PTW	Training			Incident			Anomaly		Notice	Award	Safety Tour	POB				Company
H	S	E			Man hours		No. of personnel	LTI Free Day	ACCIDENT	Near Miss	Close	Issue				HSE		All Personnel		
					TBM	In										R	P	R	P	
0	0	0	-	-	02:00	-	8	1,682	-	-	0	0	0	-	-	2	3			ایران آروین

تعداد رانندگان دارای کارت مجاز رانندگی		تعداد ماشین آلات دارای ID کارت		تعداد کل خاموش کننده ها		بیمه‌ای (تعداد لود)	گواهینامه سلامت فنی						ماتور	تخلیفات رانندگی	وضعیت کلینیک		آمبولانس آماده به کار		Company
ندارد	دارد	ندارد	دارد	شارژ ندارد	شارژ دارد		جرثقیل		سایدبوم		بیل مکانیکی				بد	خوب	ندارد	دارد	
							دارد	ندارد	دارد	ندارد	دارد	ندارد							
-		-		-		-	-		0		-		-	0	-	1	ایران آروین		

توضیحات	تعداد	شاخص های پیشگیرانه	تعداد	شاخص های واکنشی	
	0	موارد بازدید از کمپ های تابعه (محل استراحت . آشپزخانه . ..)	1	تعداد فوت (Fatality)	1
	0	آموزش HSE Induction (نفر)	2	تعداد حوادث ناتوان کننده (LTI)	2
	0	آموزش Training (نفر)	3	تعداد موارد محدود کننده (RWC)	3
3 TBM	8	Toolbox Meeting	4	تعداد صدمات منتج به خدمات درمانی (MTC)	4
	0	تعداد بازرسی حین کار (تجهیزات اطفاء حریق . برق و ...)	5	تعداد موارد استفاده از کمکهای اولیه (FAC)	5
	0	مجوز کار صادر شده (کار در ارتفاع . ورود به فضای بسته و ..)	6	تعداد بیماری های شغلی (Illness)	6
	0	آنومالی (گزارش عدم انطباق)	7	تعداد حوادث به خبر گذشته (Near miss)	7
	0	تمرین و مانور شرایط اضطراری	8	آلودگی زیست محیطی (Environmental pollution)	8
				خسارت به تجهیزات (Asset Damage)	9
				موارد حوادث جاده ای (RTA)	10
				موارد حریق	11

بستن

حذف

لیست پرسنل

فرم خام مشخصات

جدید

۱۲۳۳

کد پرسنلی

۷۴

شماره



وضعیت

پرسنل

رابطه با شرکت

HSE

واحد

شرکت

شرکت

سمت

گروه

تاریخ استخدام

نام و نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

شماره شناسنامه

کد ملی

محل صدور

محل تولد

موبایل ۱

موبایل ۲

کارت تردد ☐ انقضاء تردد

انقضاء کارت بهداشت

انقضاء گواهینامه

سریال گواهینامه

AB+

گروه خونی

☐ سوء پیشینه

☐ طب کار

☐ بومی

استان

محل سکونت

توضیحات

- کل نقرات ثبت شده: ۷۲

- پرسنل فعال (شرکت): ۶۳ پیمانکار: ۵ شرکت + پیمانکار: ۶۸

جستجوی نام

جستجوی شماره

جستجوی کد ملی

جستجوی کد پرسنلی

جدید* بستن حذف لیست فعالیت ها TBM انومالی کپی به رکورد جدید

TBM

تاریخ

شماره TBM	موضوع	تعداد نفرات
۱۴	PPE	۵
۱۵	کار در ارتفاع	۶

☒ آمبولانس و گروه امداد نجات



فعالیت جوشکاری ۲

افسر ایمنی

موقعیت ترم ۲


نوع پایپینگ

☒ مجوز


شرح

شماره انومالی	شرح انومالی	افسر ایمنی	اقدام فوری	دسته بندی	شدت
۱۱	از لوازم ایمنی استفاده نشده است		به شخص تذکرات لازم داده شد	کار در ارتفاع	متوسط
۱۲	در محل فعالیت مین دیده شده است		جلوگیری از فعالیت نیروها در محل مین و مهمات عمل نکرده زیاد		

جارت سازمانی پروژه

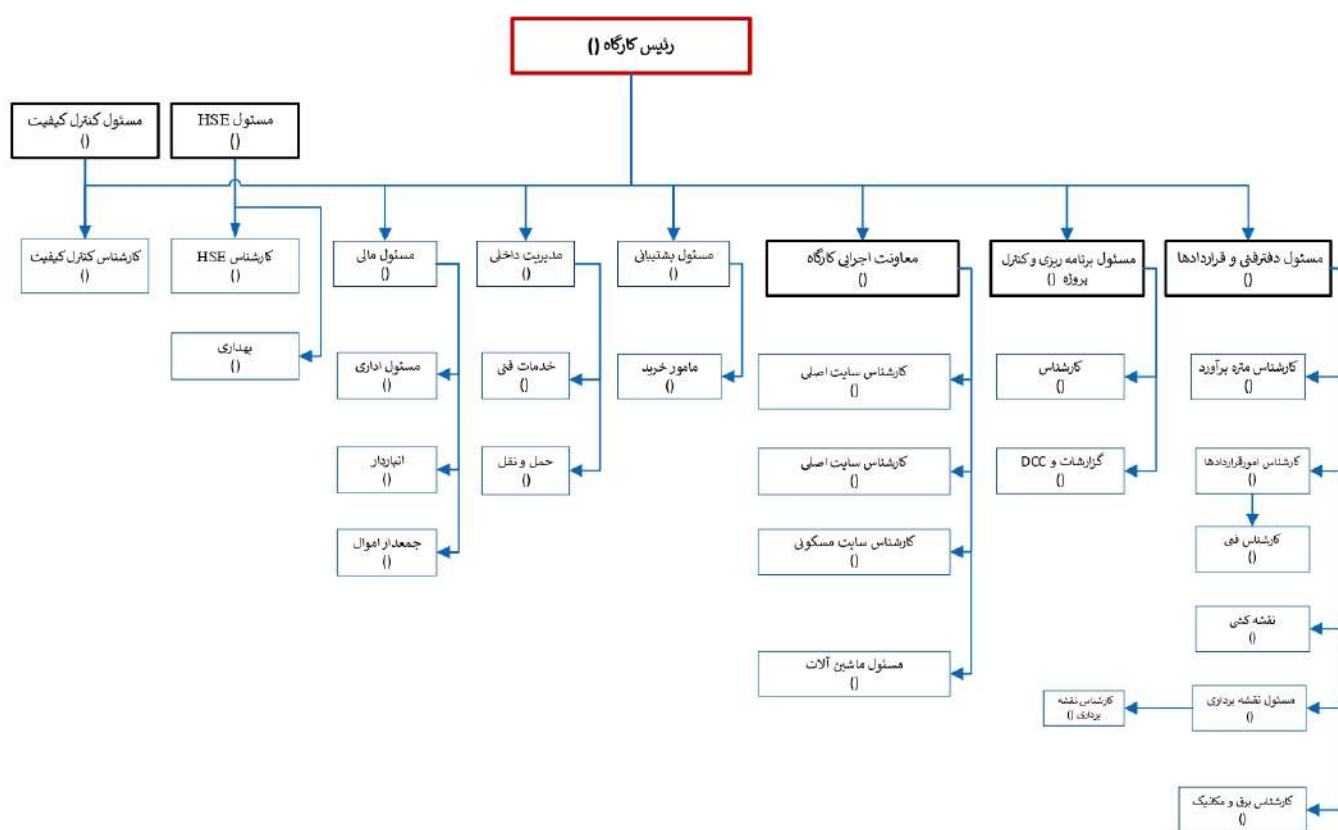

فلوچارت توزیع مدارک مهندسی دریافتی از دفتر مرکزی توسط DCC

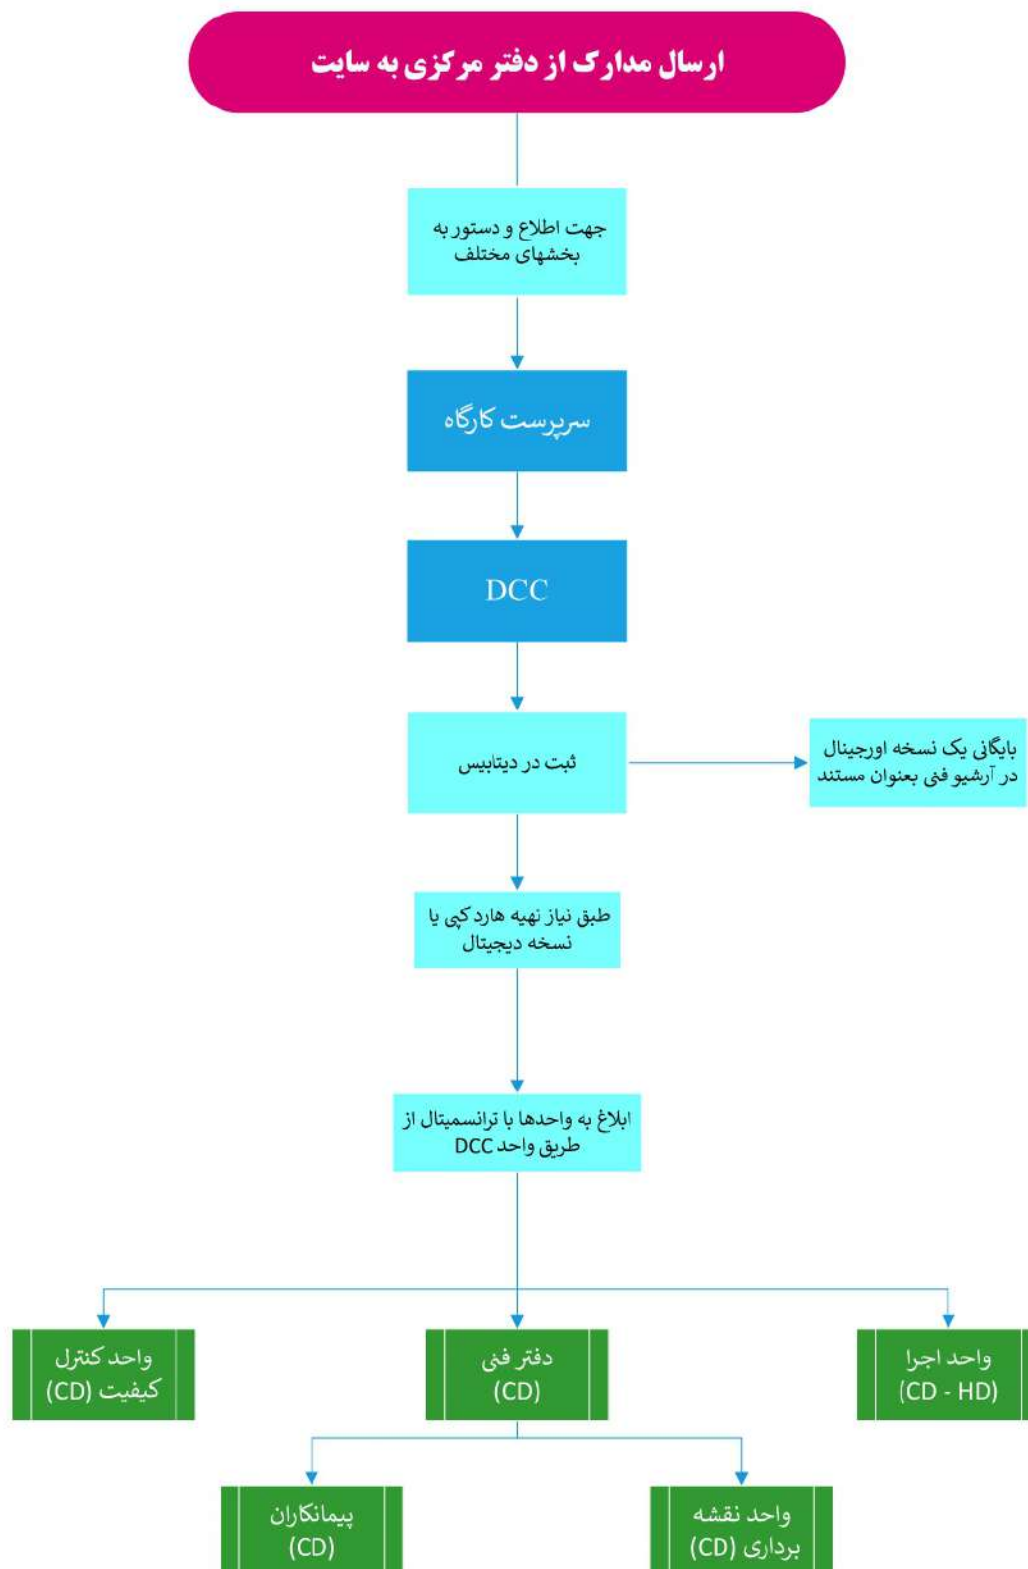

دیتابیس مدارک فنی توسط DCC تولید و جهت استفاده دفاتر فنی و یا اجرایی به اشتراک گذاشته میشود.

